



Piano regionale per la Banda Ultra Larga

Regione del Veneto - Direzione ICT e Agenda Digitale


Mestre, 22 novembre 2018



- Gap nella digitalizzazione dell'Economia e della Società
- Arretratezza delle infrastrutture e delle connessioni che abilitino i servizi a banda larga
- Strategia italiana per la banda ultra larga



Le principali tappe del Piano

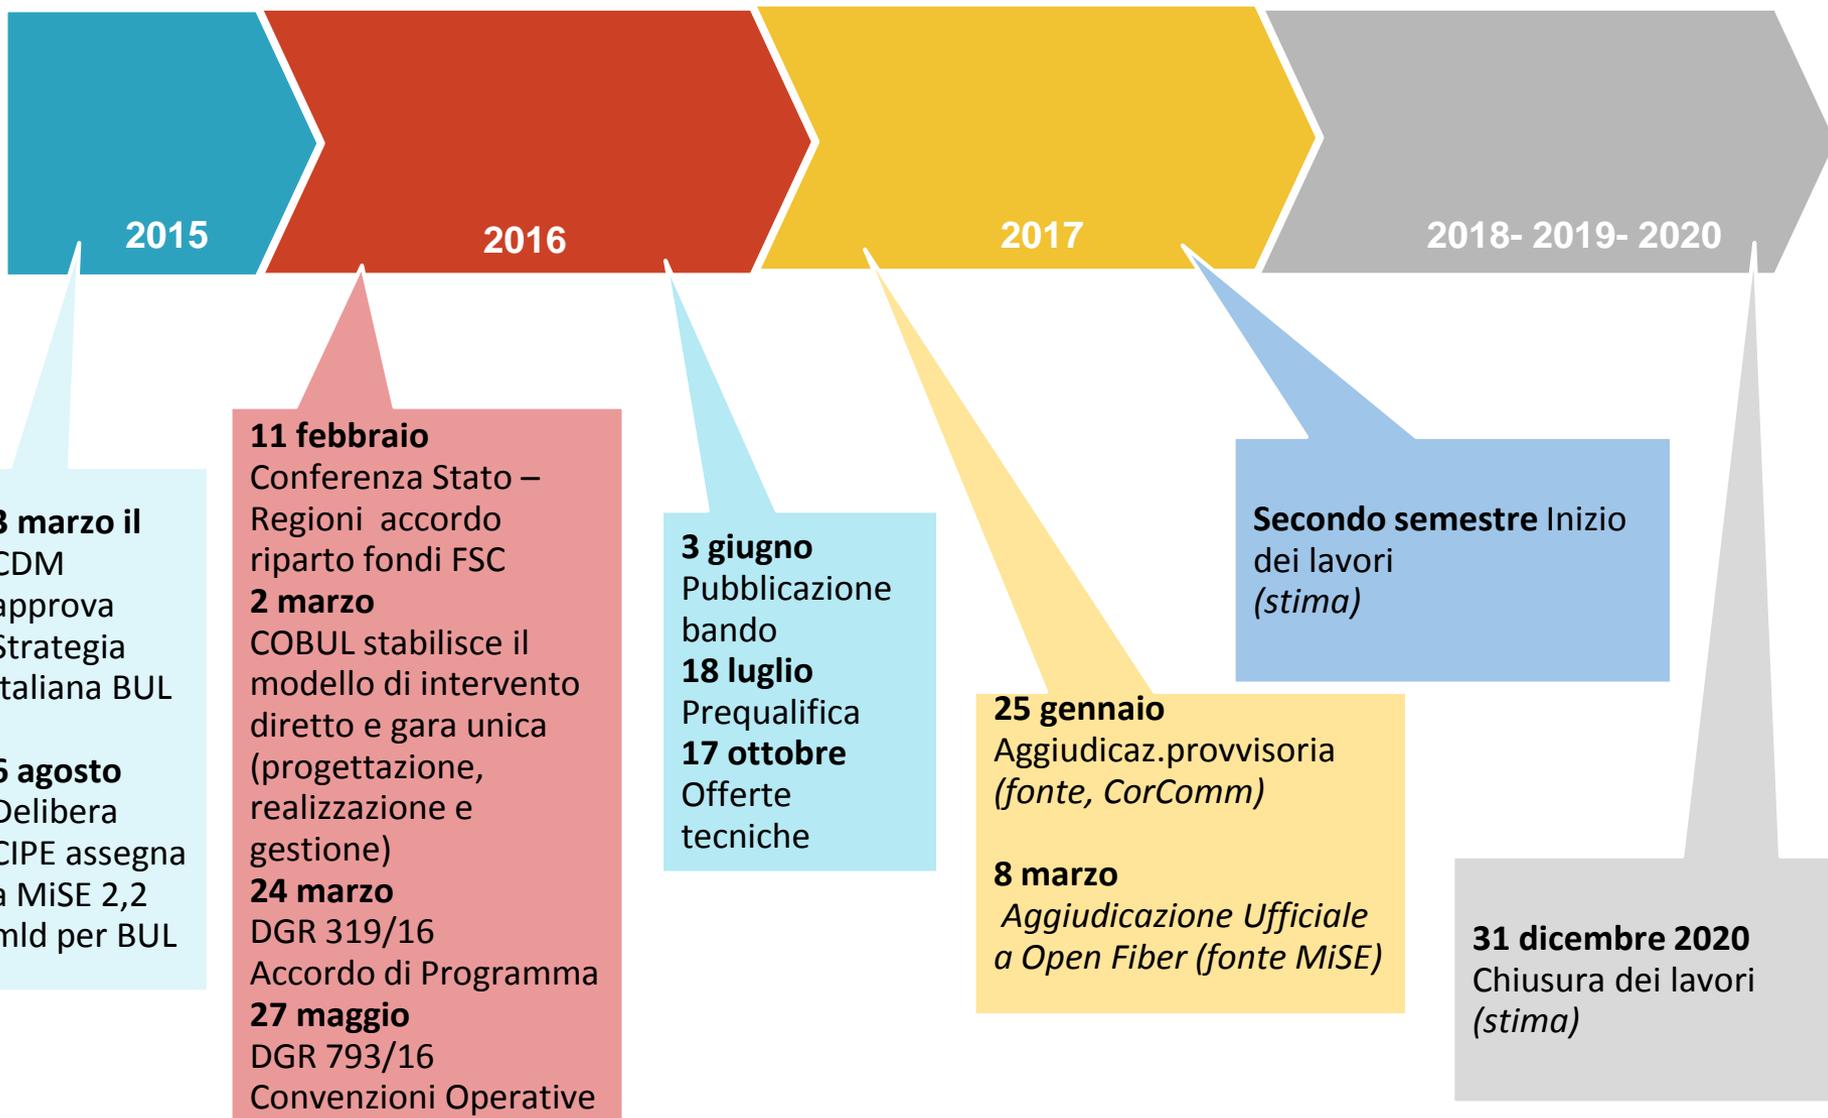



Progettazione

è iniziata nell'estate del 2017 dopo la firma del contratto tra Open Fiber ed Infratel

Realizzazione

il 4 dicembre 2017 viene inaugurato il primo cantiere a San Bellino (RO)

Monitoraggio

Regione Veneto ha definito e condiviso un modello impostato su tre livelli di controllo:

a) Comitato di coordinamento e monitoraggio BUL

(previsto dall' art. 7 Accordo di Programma dgr n.319 24/3/16)

b) SAL periodici con Infratel per aspetti tecnico/economici

c) Gruppo di lavoro (Regione-Infratel-Open Fiber) per gli aspetti operativi (stato dei lavori e criticità)



Comuni con progettazione definitiva approvata (al 14 novembre 2018)

Provincia	FASE 1			FASE 2			FASE 3			FASE 4			VENETO		
	a piano BUL	Progetto definitivo	%	a piano BUL	Progetto definitivo	%	a piano BUL	Progetto definitivo	%	a piano BUL	Progetto definitivo	%	a piano BUL	Progetto definitivo	%
Belluno	43	43	100	3	3	100	17		0	17		0	67	46	69
Padova	12	12	100	32	31	97	26	6	23	26	1	4	104	50	48
Rovigo	36	36	100	4	4	100	9		0	9		0	50	40	80
Treviso	3	3	100	16	15	94	36	1	3	36		0	95	19	20
Venezia	2	2	100	6	6	100	27	2	7	27		0	44	10	23
Verona	31	31	100	13	13	100	26	9	35	26		0	98	53	54
Vicenza	24	24	100	34	33	97	34	9	26	34	1	3	121	67	55
Veneto	151	151	100	108	105	97	175	27	15	175	2	1	579	285	49

Fonte: Infratel Italia

Progetti con ordine di esecuzione emesso

(al 14 novembre 2018)

Provincia	FASE 1			FASE 2			FASE 3			FASE 4			VENETO		
	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	%												
Belluno	43	16	37	3	2	67							46	18	39
Padova	12	6	50	31	12	39	6		0	1		0	50	18	36
Rovigo	36	17	47	4		0							40	17	43
Treviso	3		0	15	4	27	1		0				19	4	21
Venezia	2		0	6	1	17	2		0				10	1	10
Verona	31	1	3	13	2	15	9	1	11				53	4	8
Vicenza	24	4	17	33	18	55	9		0	1	1	100	67	23	34
Veneto	151	44	29	105	39	37	27	1	11	2	1	50	285	85	30

Fonte: Infratel Italia



I cantieri completati sono a:

San Bellino (RO)

Concamarise (VR)

Este (PD)

Corbola (RO)




PIANO REGIONALE DI SVILUPPO DELLA BANDA ULTRA LARGA

DGR n. 319 del 24/3/2016 DGR n. 793 del 27/5/2016
DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE
U.O. Strategia ICT e Agenda Digitale




-  Progetti definitivi approvati (285 Comuni)
-  Progetti con ordine di esecuzione emesso (85 Comuni)

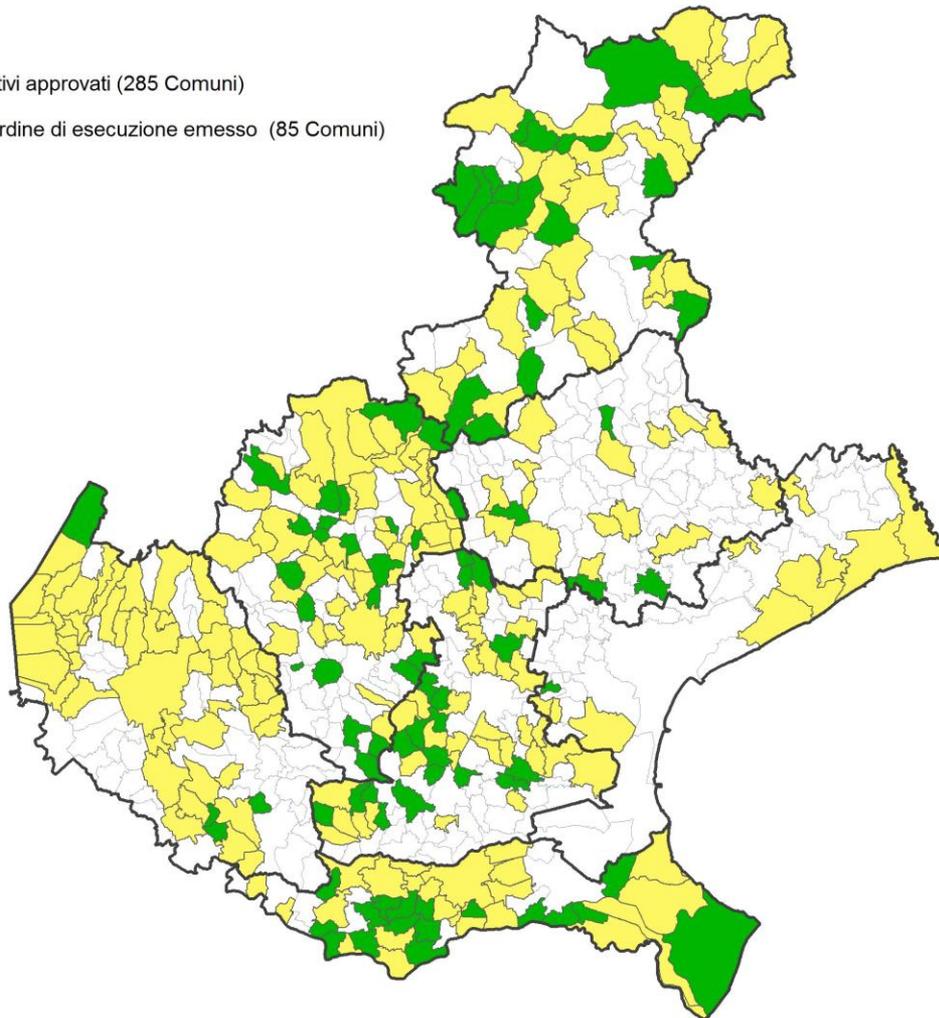



- Ritardi maturati
- Complessità delle procedure di richiesta/rilascio permessi
- Rispetto del Performance Framework



Banda Ultra Larga

Banda Larga

Il Piano regionale sulla Banda Larga è il documento attuativo delle iniziative per la realizzazione delle reti fin fibra ottica e l'attivazione o il potenziamento del servizio di connettività

ACCEDI AL PIANO REGIONALE SULLA BANDA LARGA

GLI INTERVENTI REGIONALI PER COMUNE

SEGNALA IL LIVELLO DI CONNETTIVITA' NEL TUO COMUNE



IL CENTRO DI COMPETENZA SULLA BANDA LARGA



Grazie per l'attenzione

tranquillo.chiaranda@regione.veneto.it

cbl@regione.veneto.it
